




Regionalt historiesenter

Nytt museums- og arkivbygg på Domkirkeodden.

Interkommunalt politisk råd, 13. september 2022

Regionalt historiesenter - innhold



Samfunnsoppdraget

Mål:


*Det regionale historiesenteret
Domkirkeodden skal være en unik
møteplass for kulturhistorisk
formidling og kunnskap i Innlandet*



Historiesenterets merverdi

- *En arena for teknologiutvikling*
- *Mer tilgjengelige arkiver*
- *Bedre og bredere formidling*
- *Økt forskning og faglige dialog*



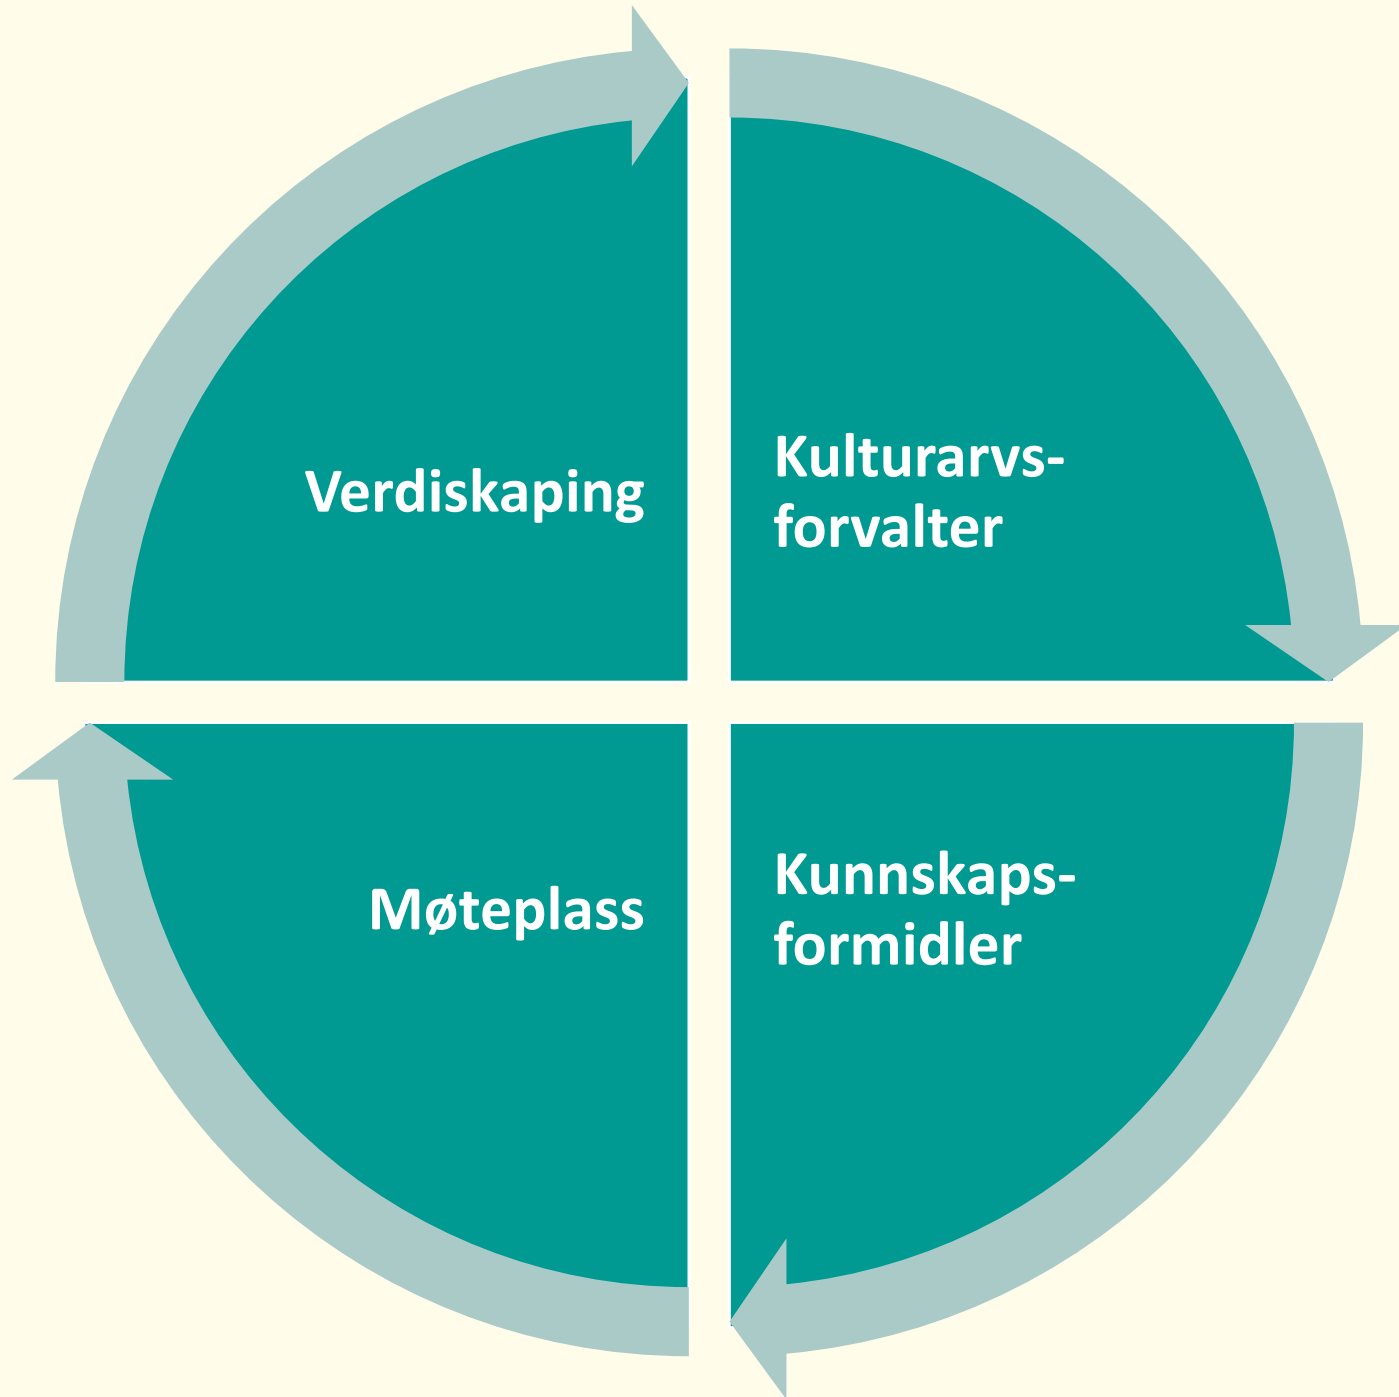

Fremdriftsplan

	Start	Avsluttet
Forprosjekt	Jan 2022	Nov 2022
Arkeologiske undersøkelser	April 2022	Okt 2022
Prosjektering	Okt 2022	Feb 2023
Anbudsprosess	Feb 2023	Juni 2023
Byggefase	Aug 2023	Nov 2024
Arkivinnflytting/ produksjon utstillinger	Jan 2025	April 2025
Regionalt historiesenter åpnes	Mai 2025	

Finansiering Regionalt Historiesenter

Fordeling lokalt og regionalt er vi i innledningen av dialog med følgende grunnlag:

Innlandet fylkeskommune	>50 mill
Hamar kommune	30 mill
Regionkommuneandel (Innbyggertall)	
Hamar kommune	4 mill
Ringsaker kommune	4 mill
Stange kommune	2,5 mill
Løten kommune	1 mill

Sparebankstiftelsen Hedmark (Formidling barn&unge etc. iht stiftelsens formål)	>20 mill
Eidsiva	>15 mill



Totalbudsjett 312 mill



Normalfordeling med 1/3 stat, 1/3 regionalt og 1/3 lokalt avveket betydelig i dialog med Kulturdepartementet



Prosjektets økonomifordeling i dialog med Kulturdepartementet er som følger:

Stat	212 millioner
Regionalt	50 millioner
Lokalt	50 millioner

